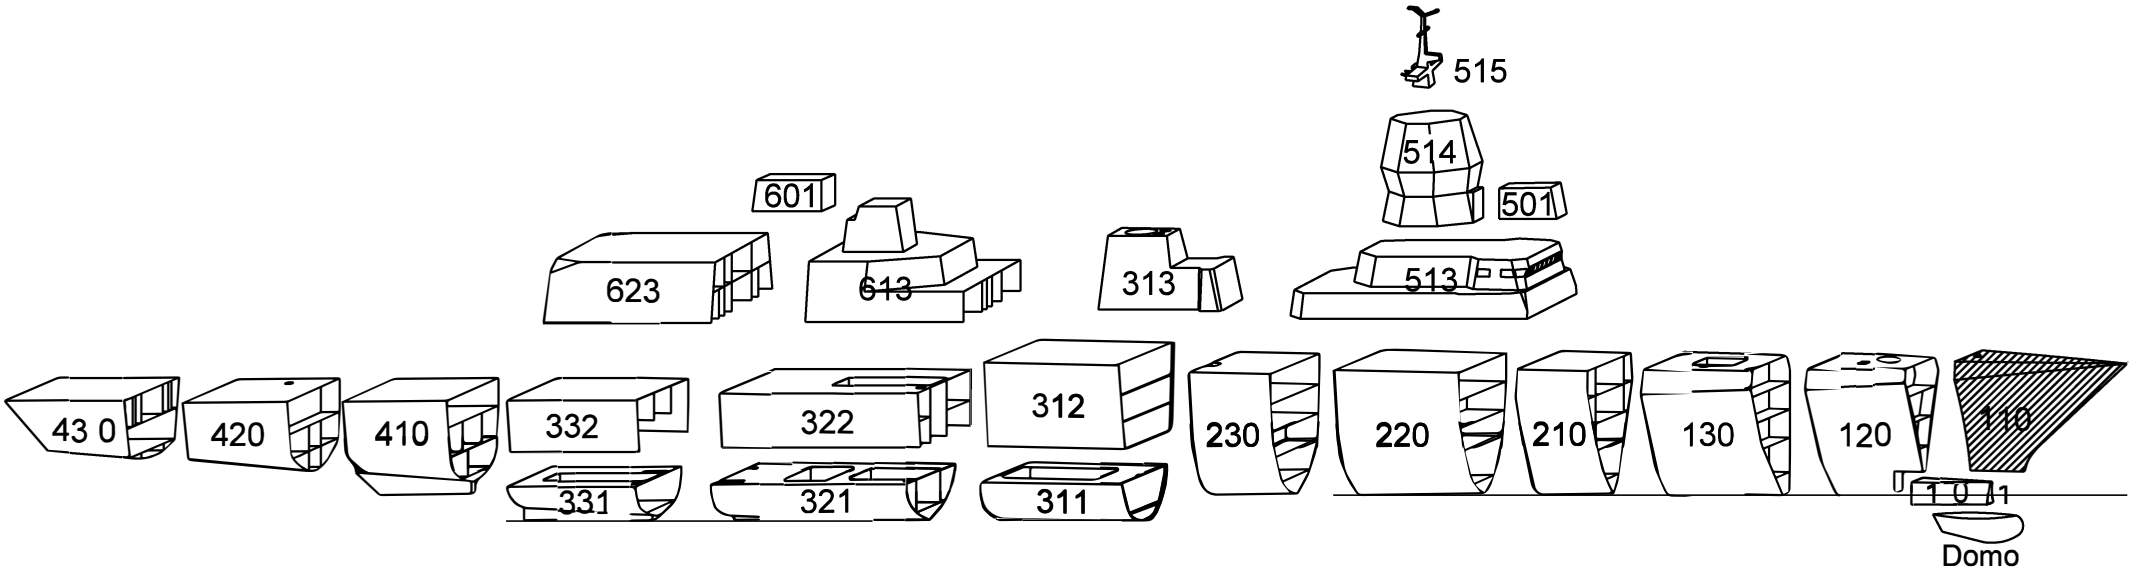


ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA - BLOQUE 110	
Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	
FECHA: 25.04.03	REV: A
INGENIERIA DE PRODUCCION	

REALIZADO	FLR	21.04.03
COMPROBADO	FLR	23.04.03
APROBADO	JACM	25.04.03

REGISTRO DE REVISIONES

REV.	PÁGS. AFECTADAS	DESCRIPCION	FECHA	APROB.
A	Todas	Revisión completa del documento	25.04.03	JACM


CONTENIDO DEL CUADERNO

REGISTRO DE REVISIONES....1
CONTENIDO DEL CUADERNO....2
REFERENCIAS....4
GRAFICO 1 – DISPOSICIÓN GENERAL – B110....5
GRAFICO 2 – PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y PREARMAMENTO....6
1. IDEAS BÁSICAS DE LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA DE ESTE BLOQUE....7
2. ETAPAS Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE....9
3. TRABAJOS MÁS IMPORTANTES A REALIZAR EN PREARMAMENTO....11
3.1 Fase de Prearmamento P1 (110/1 & 110/2)....11
3.2 Chorreado y pintado (110/1 & 110/2)....12
3.3 Fase de Prearmamento P2 (B110)....13
3.4 Excepciones y casos especiales....14
4. SECUENCIA Y RUTAS DE MONTAJE....15
TRABAJOS A REALIZAR EN CADA ETAPA DE PREARMAMENTO, DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FECHA DE NECESIDAD DEL PLANO....17
5.1 110.SB3.I....18
5.2 110.SB2.I....19
5.3 110.P1/1.N....20
5.4 110.CHP/1.N....21
5.5 110.SB1.I....22
5.6 110.SB01.I....23
5.7 110.P1/2.N....24
5.8 110.CHP/2.N....25
5.9 110.P2.N....26
6. PLANOS NECESARIOS EN PREARMAMENTO DEL BLOQUE 110....28
6.1 SECCIÓN ESTRUCTURAS....29
6.2 SECCIÓN INGENIERÍA MECÁNICA....30
6.3 SECCIÓN ELECTRICIDAD....31
6.4 SECCIÓN ELECTRÓNICA....32
6.5 SECCIÓN SISTEMAS DE TUBERÍAS....33
6.6 SECCIÓN EQUIPO Y HABILITACIÓN....34


6.7 SECCIÓN CONTROL DE PLATAFORMA 35
7. LISTA DE ORDENES DE TRABAJO DEL BLOQUE 110 36
7.1 ACEROS 37
7.2 ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ARMAS 38
7.3 HABILITACIÓN 39
7.4 MONTURAS 40
7.5 PINTORES 41
7.6 PLOMEROS 42
8. LISTA DE ORDENES DE TRABAJO Y PLANOS DEL BLOQUE 110 43
8.1 ACEROS 44
8.2 ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ARMAS 46
8.3 HABILITACIÓN 47
8.4 MONTURAS 48
8.5 PINTORES 49
8.6 PLOMEROS 50

REFERENCIAS


Nº	TIPO DOC.	DOCUMENTO	TITULO	REV	OBSERVACIONES
1	Plano	8028000010S	Disposición General	C	--------
2	Plano	1001000020S	Disposición de Bloques	A	--------
3	Doc. Estrategia	8139130200F	Arbol de Productos Intermedios F310	-	--------

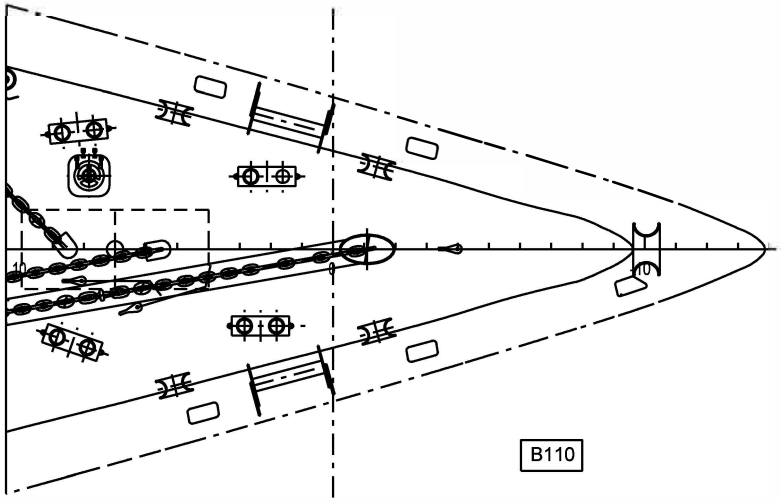


CUBIERTA 1

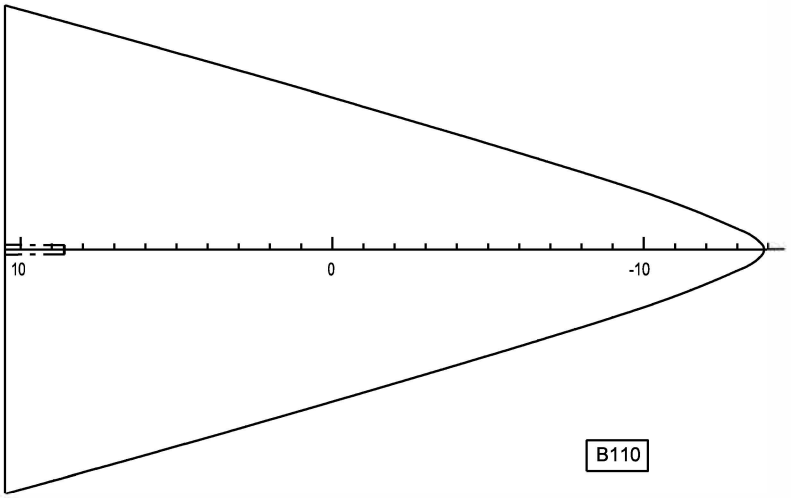


CUBIERTA 01

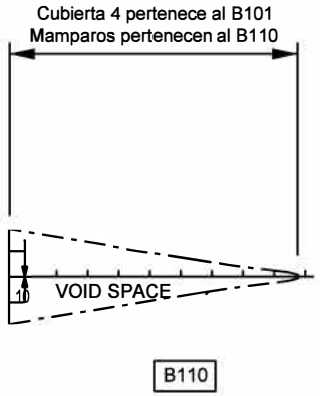

CUBIERTA 4

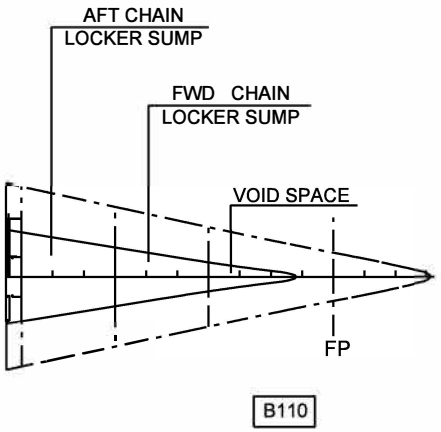

CUBIERTA 3

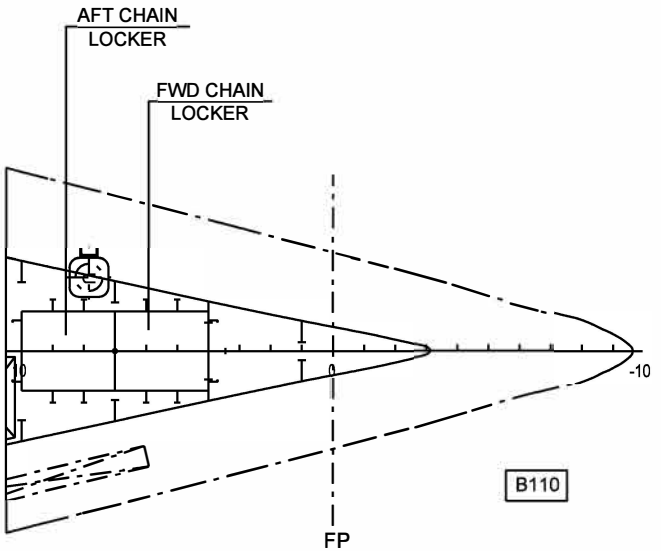


CUBIERTA 2


De acuerdo con el Plano 8028000010S Rev.C

FRAGATA	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y PREARMAMENTO DEL BLOQUE 110 - GRÁFICO 2	Nº Doc.: 110.9.13.001.0F Revisión: A Pagina: 6 de 50 Fecha: 25.04.03


INICIO PREARMAMENTO - P1 → FIN PREFABRICADO

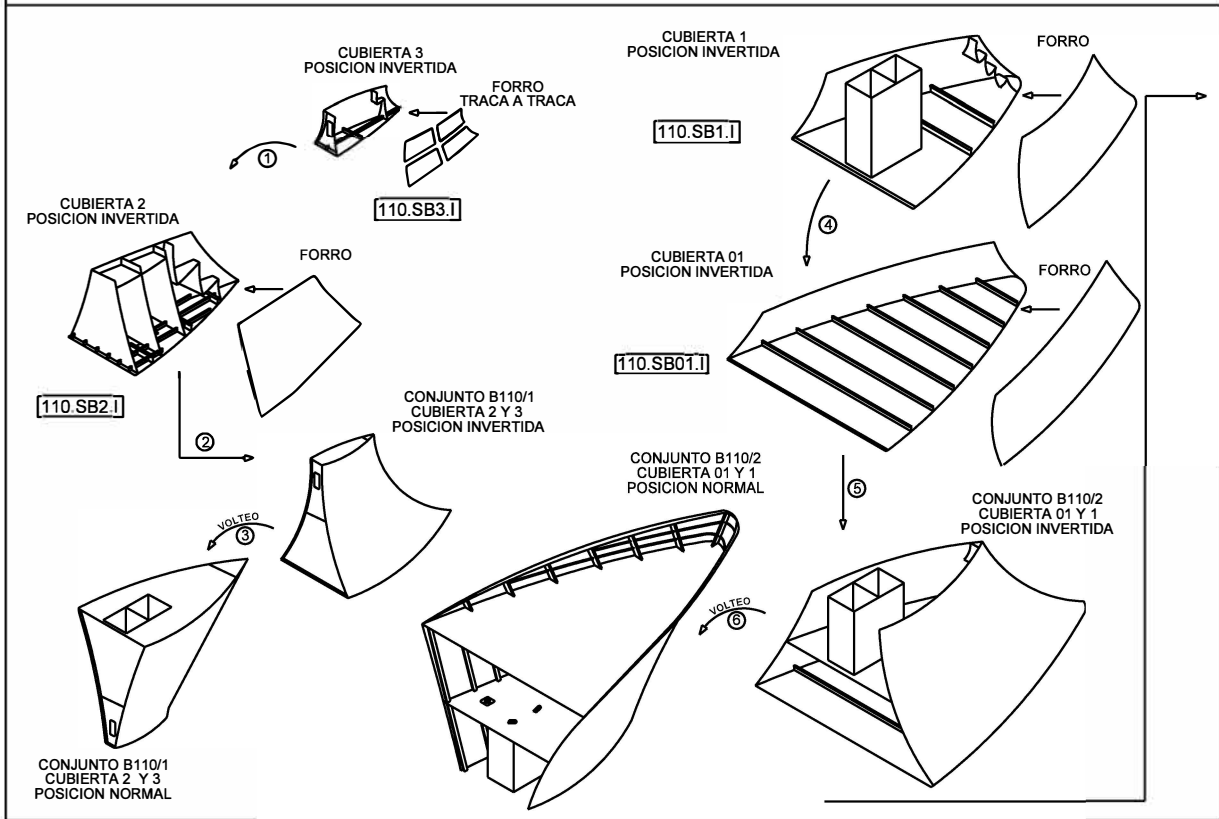


FIN PREFABRICADO → FIN PREARMAMENTO - P1

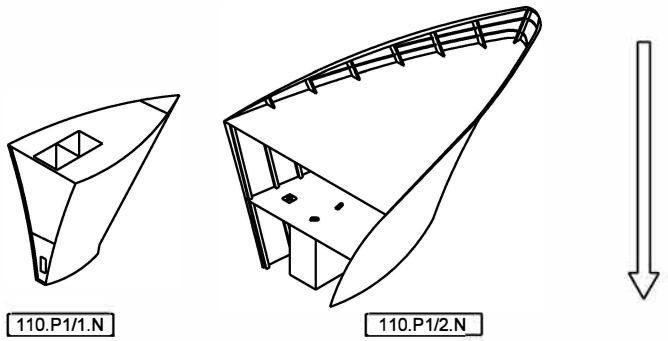


CHORREADO Y PINTADO

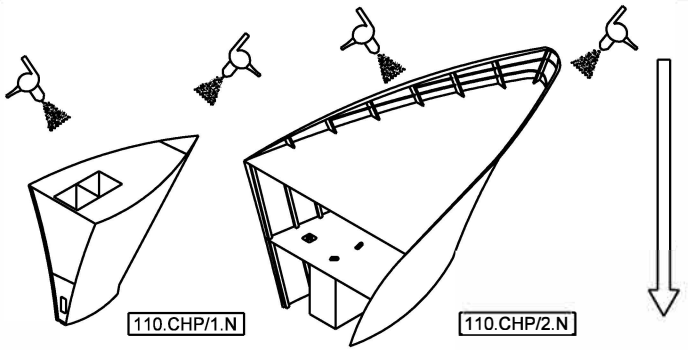

MONTAJE EN GRADA

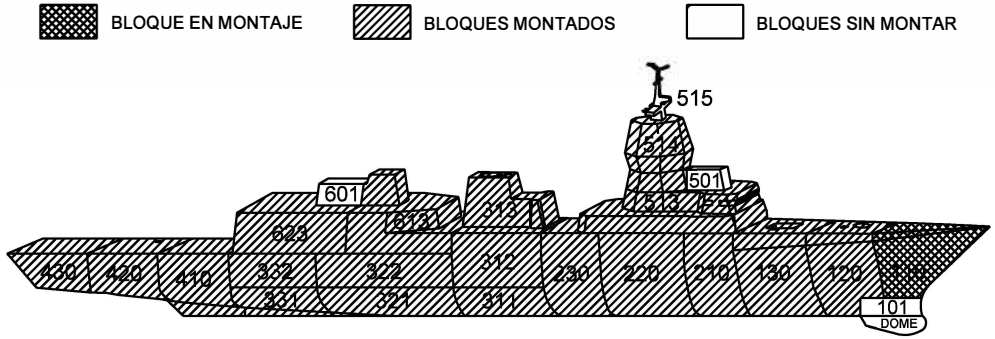

FIN PREARMAMENTO - P2 ← INICIO PREARMAMENTO - P2

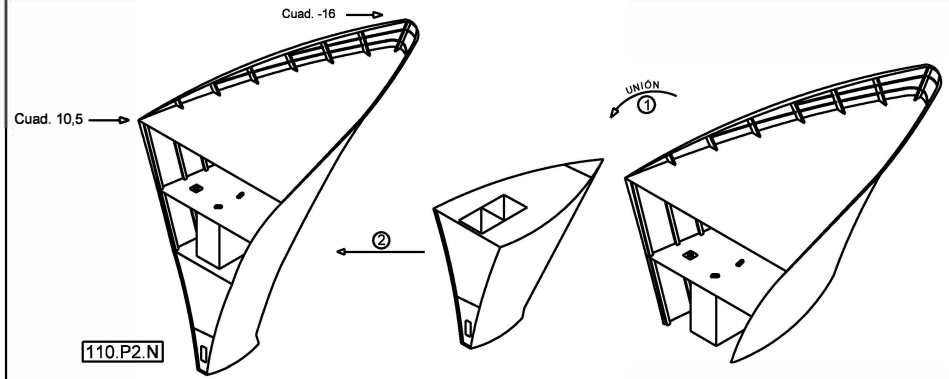

1. IDEAS BÁSICAS DE LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA DE ESTE BLOQUE

1. Los topes de proa y popa del B110 se sitúan en las cuadernas -16 y 10,5 respectivamente. Además, el B110 limita con el B101 mediante un tope horizontal situado justo sobre la cubierta 4.
2. Las dimensiones y el peso aproximado de la estructura se indican en la tabla siguiente (incluyendo amurada).

DIMENSIONES MÁXIMAS (m)			PESO (T)	CUADERNA DE PROA	CUADERNA DE POPA
Eslora	Manga	Puntal			
16,2	12,3	12,5	63	-16	10,5

3. El bloque está abierto por su extremo de popa por encima de la cubierta 2. El mamparo 10 cierra los locales situados bajo dicha cubierta. Una plataforma provisional cierra por su parte inferior el tronco de acceso al local del trasnductor del sonar, pero deberá ser retirada antes del montaje del B101 (durante la varada).
4. Bajo la cubierta 3 se sitúan los espacios siguientes ("A" = abierto/sin conformar; "C" = cerrado/conformado):
   - Tronco de acceso al local del transductor del sonar (A).
   - Espacio vacío/inaccesible (A).
5. Sobre la cubierta 3 se sitúan los espacios siguientes:
   - Cajas de cadenas (pr/pp) (A).
   - Pocetes de cajas de cadenas (pr/pp) (C).
   - Espacio vacío/inaccesible (C).
   - Espacio vacío (C).
6. Sobre la cubierta 2 se sitúan los espacios siguientes:
   - Cajas de cadenas (pr/pp) (A).
   - Local maquinaria molinetes y pañol efectos cubierta (A).
   - Espacio vacío/inaccesible (C).
7. Sobre la cubierta 1 se sitúan los espacios siguientes:
   - Estación de amarre y remolque de proa (A).


8. La cubierta 01 es exterior.

9. Debido a sus dimensiones, y para facilitar su manejo en las etapas iniciales, el bloque ha sido dividido en dos conjuntos (110/1 y 110/2) mediante un tope horizontal situado aproximadamente a 100 mm sobre la cubierta 2.
   - El conjunto B110/1 es la parte inferior del B110. Sus topes de proa y popa están en las cuadernas -3,2 y 10,5 respectivamente.
   - El conjunto B110/2 es la parte superior del B110. Sus topes de proa y popa están en las cuadernas -16 y 10,5 respectivamente.

   Estos conjuntos constituyen productos intermedios independientes durante las etapas de:
   - Prefabricado.
   - Prearmamento P1.
   - Chorreado y Pintado.

   Tras el chorreado y pintado se realizará la unión de los conjuntos (110/1 y 110/2), formándose el B110 que constituye el producto intermedio en el que se realizarán los trabajos de la etapa de Prearmamento P2 y el montaje en grada.

   El esquema general del proceso se muestra en el gráfico adjunto:



2. ETAPAS Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE

La construcción del B110 se realizará siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Prefabricación de los cuatro productos intermedios principales (ver gráfico 2):

   Conjunto inferior (B110/1):

   - 110.SB3.I (SB3): Formado por la estructura de la cubierta 3 (CB3), reforzado de forros, mamparos (entre el tope inferior a la cubierta 3) y plataforma provisional. Posición invertida. Las planchas de los forros se colocarán traca a traca.
   - 110.SB2.I (SB2): Formado por la estructura de la cubierta 2 (CB2), paneles de forros (FEB2/FEE2) y mamparos (entre cubiertas 2 y 3). Posición invertida.

   Conjunto superior (B110/2):

   - 110.SB1.I (SB1): Formado por la estructura de la cubierta 1 (CB1), paneles de forros (FEB1/FEE1) y mamparos (entre cubiertas 1 y 2). Posición invertida.
   - 110.SB01.I (SB01): Formado por la estructura de la cubierta 01 (CB01), paneles de forros (FEB01/FEE01) y mamparos (entre cubiertas 01 y 1). Posición invertida.

   La prefabricación del SB3 se realizará según se indica:

   - Armar CB3 (planchas de cubierta, baos, esloras, etc) en posición invertida.
   - Armar de forma separada el resto de los productos intermedios: mamparos, plataforma provisional, etc (planchas, y reforzado).
   - Unir todos los productos intermedios y montar el reforzado de los forros.
   - Situar y soldar traca a traca las planchas de los forros.

   La prefabricación del SB2 se realizará según se indica:

   - Armar CB2 (planchas de cubierta, baos, esloras, etc) en posición invertida.
   - Armar de forma separada el resto de los productos intermedios: paneles de forro, mamparos, etc (planchas, y reforzado).
   - Unir todos los productos intermedios.

   Los procesos de construcción del SB1 y el SB01 son similares al del SB2.

   Iniciar el prearmamento en posición invertida en los productos intermedios cuando hayan sido armados

Cuando el nivel de prefabricación lo permita, comenzará la fase de prearmamento P1 en los productos intermedios SB3, SB2, SB1 y SB01 con el montaje de la tubería interna y demás elementos soldados situados a techo (110.SB3.I, 110.SB2.I, 110.SB1.I y 110.SB01.I).

2. Armar los conjuntos B110/1 y B110/2 cuando el Prearmamento P1 en posición invertida haya finalizado. El proceso se realizará según se indica:

   Conjunto inferior (B110/1):

   - Situar el SB3 sobre el SB2 en posición invertida.
   - Unir el SB2 con el SB3 en posición invertida.
   - Voltear el conjunto B110/1 a posición normal.

   Conjunto superior (B110/2):

   - Situar el SB1 sobre el SB01 en posición invertida.
   - Unir el SB1 con el SB01 en posición invertida.
   - Voltear el conjunto B110/2 a posición normal.

3. Continuar el Prearmamento P1 en posición normal y completar antes de la etapa de chorreado y pintado (110.P1/1.N y 110.P1/2.N).
4. Chorrear y pintar los conjuntos B110/1 y B110/2 por separado (110.CHP/1.N y 110.CHP/2.N).
5. Después del chorreado y pintado, unir los conjuntos B110/1 y B110/2 para formar el B110.
6. Iniciar la etapa de Prearmamento P2 (110.P2.N).
7. Montaje en grada del bloque en IZAR Astillero Ferrol después de completar el Prearmamento P2.

3. TRABAJOS MÁS IMPORTANTES A REALIZAR EN PREARMAMENTO

3.1 Fase de Prearmamento P1 (110/1 & 110/2)

Los principales trabajos a realizar en esta etapa son los que se relacionan a continuación:

1. Montaje de tubería, con su soportado, penetraciones, accesorios (válvulas, filtros, etc). No estarán incluidos los tramos de manguera flexible (P2), la tubería de conexión a equipos (P2) ni la tubería de cierre entre bloques (zona).
2. Montaje de descargas al mar. Incluyendo el reforzado del casco y las piezas de desgaste.
3. Montaje de polines y reforzado para equipo eléctrico y electrónico diverso.
4. Montaje de polines y reforzado para elementos diversos en la estación de amarre y remolque de proa. Incluyendo los polines para bitas, guía de proa, consola control molinetes, estopor del ancla de proa, etc[1].
5. Montaje de las brazolas de escotillas y registros, incluyendo los retenedores y soportes para sensores de posición. Las brazolas se montarán con su tapa para dar rigidez al conjunto durante la instalación, aunque las tapas se desmontarán antes de chorrear y pintar el bloque.
6. Montaje de canalizaciones, penetraciones de cables y soportes de equipo eléctrico y electrónico.
7. Montaje de escalas verticales. La escala entre la cubierta 1 y 2 se montará tras la unión de los conjuntos B110/1 y B110/2.
8. Montaje de elementos diversos del sistema de protección catódica activo: soportado para electrodos de referencia[2], etc.
9. Montaje de escobenes y regolas.
10. Montaje de gateras y reforzado de cubierta.
11. Montaje de soportado para carreteles de estachas en la estación de amarre y remolque de proa.
12. Montaje de elementos diversos en la estación de amarre y remolque de proa. Incluyendo las bitas, guía de proa, cáncamo de remolque y reforzado de cubierta, etc.

[1] Ver 3.4.- Excepciones y casos especiales.
[2] Estrategia de instalación preliminar. Los electrodos de referencia están situados provisionalmente próximos a la unión B110-B101. Pendiente de situación definitiva.

13. Montaje de elementos diversos para maniobra de anclas. Incluyendo el soportado para plancha de rozamiento, cáncamos para bozas de cadenas, reforzado de cubierta , etc.
14. Montaje de tinteros, soportes y reforzado para asta de bandera de proa.
15. Montaje de varillas para aislamiento.
16. Montaje de elementos diversos soldados a la estructura:
17. Montaje de elementos diversos soldados a la estructura:
    - Tinteros, soportes y reforzado de cubierta para candeleros desmontables.
    - Tinteros, soportes y reforzado de cubierta para candeleros de mal tiempo.
    - Cáncamos y orejetas para maniobra de equipos y reforzado sobre escotillas.
    - Soportes de aparatos y elementos diversos de instrumentación.
    - Estibas de elementos diversos.

3.2 Chorreado y pintado (110/1 & 110/2)

Con el bloque armado completamente, y una vez finalizadas las etapas 110.P1/1.N y 110.P1/2.N, se introducirán los conjuntos B110/1 y B110/2 en la cabina de chorreado para proceder a su chorreado y pintado (110.CHP/1.N y 110.CHP/2.N). Estas operaciones se realizarán según se indica a continuación:

1. Protección de elementos previo a chorreado: se protegerán adecuadamente los equipos, válvulas y cualquier otro elemento que pueda ser dañado durante la operación o que no deba ser pintado. Se taparán los extremos abiertos de tuberías y conductos.
2. Chorreado del bloque según las especificaciones del plano. Después de este proceso se repondrán las protecciones dañadas.
3. Pintado de los conjuntos B110/1 y B110/2 de acuerdo con las especificaciones del plano. En las zonas de unión entre conjuntos y con otros bloques se imprimará una zona de aproximadamente 300 mm desde el tope, y se protegerá posteriormente con cinta adhesiva para evitar ser pintada con el resto del bloque.
4. Retirar todas las protecciones una vez finalizado el pintado.
5. Chorrear y pintar la zona de unión entre los conjuntos B110/1 y B110/2 una vez que el B110 haya sido armado completamente.

El chorreado y pintado de los espacios inaccesibles situados en la zona de proa (zona de buzardas) se realizará antes de que dichos espacios sean cerrados, por lo deberán coordinarse las con las tareas de prefabricación de la estructura.

3.3 Fase de Prearmamento P2 (B110)

En los locales situados sobre la cubierta 2 no comenzarán los trabajos propios de P2 hasta que finalicen las tareas de unión entre los conjuntos. Estas tareas incluyen:

1. Unión estructural de los conjuntos B110/1 y B110/2.
2. Trabajos propios de la fase P1 de prearmamento no realizados hasta el momento en dicha zona. Entre otros serán:
    - Montaje de tubería de cierre entre los conjuntos.
    - Montaje de escala vertical sobre cubierta 2.
3. Chorreado y pintado de la zona de unión.

Además de los trabajos de unión de los dos conjuntos, los principales trabajos a realizar en la fase P2 son los siguientes:

Además de las tareas en la zona de unión de conjuntos, durante el Prearmamento P2 se realizarán los siguientes trabajos:

1. Montaje de tapas de escotillas y registros.
2. Tendido de cables.
3. Montaje de equipo eléctrico y electrónico diverso.
4. Montaje de tubería de conexión a equipos.
5. Montaje de carreteles para estachas en la estación de amarre y remolque de proa.
6. Montaje de portas de costado de la estación de amarre y remolque de proa. Incluyendo las tapas hidráulicas para guías de estachas, portas de observación, etc[3].
7. Montaje de polines para guías de estachas en amuras (br/er). Deben montarse después de las tapas hidráulicas.
8. Montaje de elementos diversos en la estación de amarre y remolque de proa. Incluyendo las guías en amuras (br/er), estopor del ancla de proa, etc.
9. Conexionado de los sistemas de Fuerza, Alumbrado y Alarma de detección de incendios.
10. Repasos de pintado en bloque.

[3] Puntos 6 a 8: Ver 3.4.- Excepciones y casos especiales.

Previamente al montaje de cualquier equipo, se comprobará el estado de su polín, verificándose cuando proceda, que cumple los requisitos especificados para él: posición, planicidad, verticalidad, puesta a masa etc.

El montaje de los equipos incluye su puesta a masa en los casos en que sea necesaria.

3.4 Excepciones y casos especiales

Independientemente de lo indicado anteriormente se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones:

1. Se evitará montar equipos y elementos que puedan sufrir daños por estar situados en el exterior del bloque, en las proximidades de los topes, o en zonas en las que esté previsto realizar trabajos que puedan deteriorarlos (oxicorte, soldadura, repasos de pintado, etc). Teniendo en cuenta lo anterior, no se instalarán durante el prearmamento los siguientes elementos (instalar en zona después del montaje en grada del B110).
    - Polines para molinetes.
    - Elementos diversos en el pañol de efectos de cubierta: Estiba para candeleros de mal tiempo, estiba para cabos, etc.
    - Molinetes de anclas, consolas de control y otros elementos en la estación de amarre y remolque de proa.
    - Escala vertical en el tronco de acceso al local del transductor del sonar.
2. Las portas de costado no pueden ser instaladas durante el Prearmamento P1 porque incluyen componentes que podrían dañarse durante el chorreado y pintado y no pueden ser desmontadas. Se instalarán durante el Prearmamento P2.
3. Los polines para las guías para estachas de las amuras, no pueden montarse antes de la instalación de las portas de costado (tapas hidráulicas). Por esta razón, las guías y sus polines deberán instalarse durante la fase P2[4]. Para reducir las tareas de soldadura cerca de las portas de costado, las guías y sus polines se soldarán entre ellos antes de su montaje a bordo.

[4] Ver punto 2.

4. SECUENCIA Y RUTAS DE MONTAJE

Una vez que el B110 esté completamente conformado, el acceso a su interior se realizará según se indica (ver gráficos).


1. Los locales situados sobre la cubierta 2 están abiertos al exterior por popa, por lo que el acceso será directo.

   Los molinetes de anclas y su unidad de potencia hidráulica deberán ser embarcados antes del montaje en grada del B110. Para ello, será necesario desmontar parcialmente los molinetes[5]. En caso de que los molinetes no puedan ser desmontados, se embarcarán tras el montaje en grada del B110 a través de cesáreas situadas en el techo del local (opción secundaria).


2. Acceso a las cajas de cadenas y al espacio vació situado bajo la cubierta 2 a través de registros[6].

3. Acceso al local bajo la cubierta 3 a través del paso de hombre en el mamparo 10.


4. El acceso a los espacios vacíos/inaccesibles de proa (zona de buzardas) es prácticamente imposible una vez que estos espacios hayan sido cerrados definitivamente. Por ello, será necesario coordinar los trabajos de prefabricación de la estructura con las demás tareas que haya que realizar en el interior de estos espacios (montaje de escoben y regola, chorreado y pintado, unión de bloques, etc).

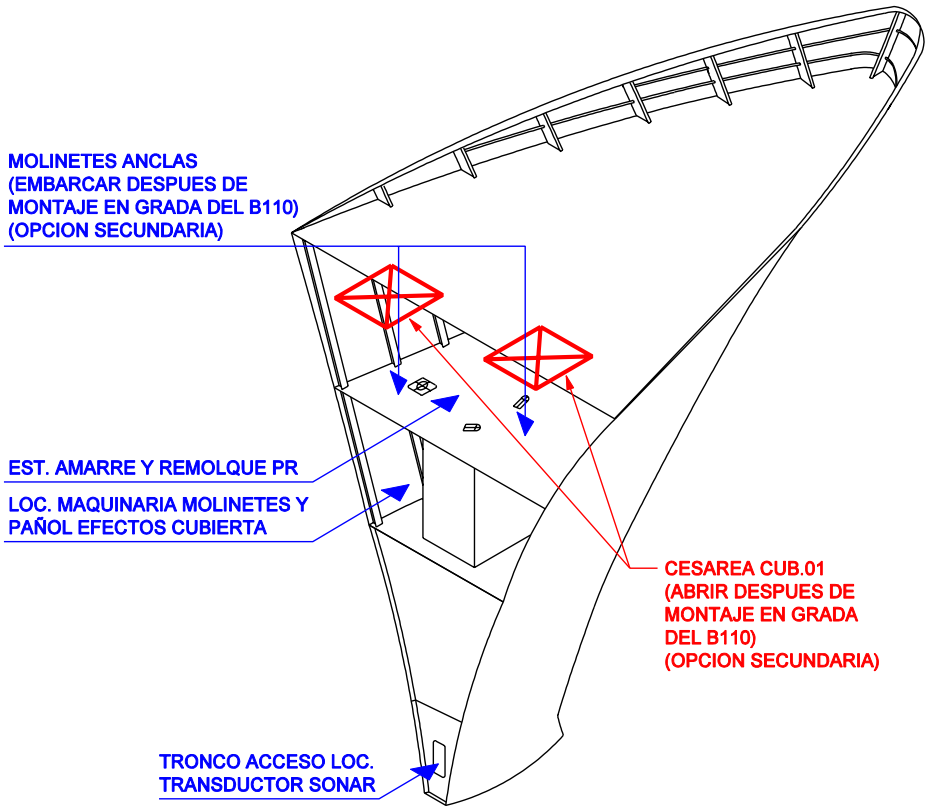

[5] Pendiente de confirmación por parte del fabricante de los molinetes acerca de la posibilidad su desmontarlos para facilitar el embarque.
[6] Se ha solicitado a la Oficina Técnica que sitúe accesos permanentes a las cajas de cadenas (registro o similar). Pendiente de aprobación.

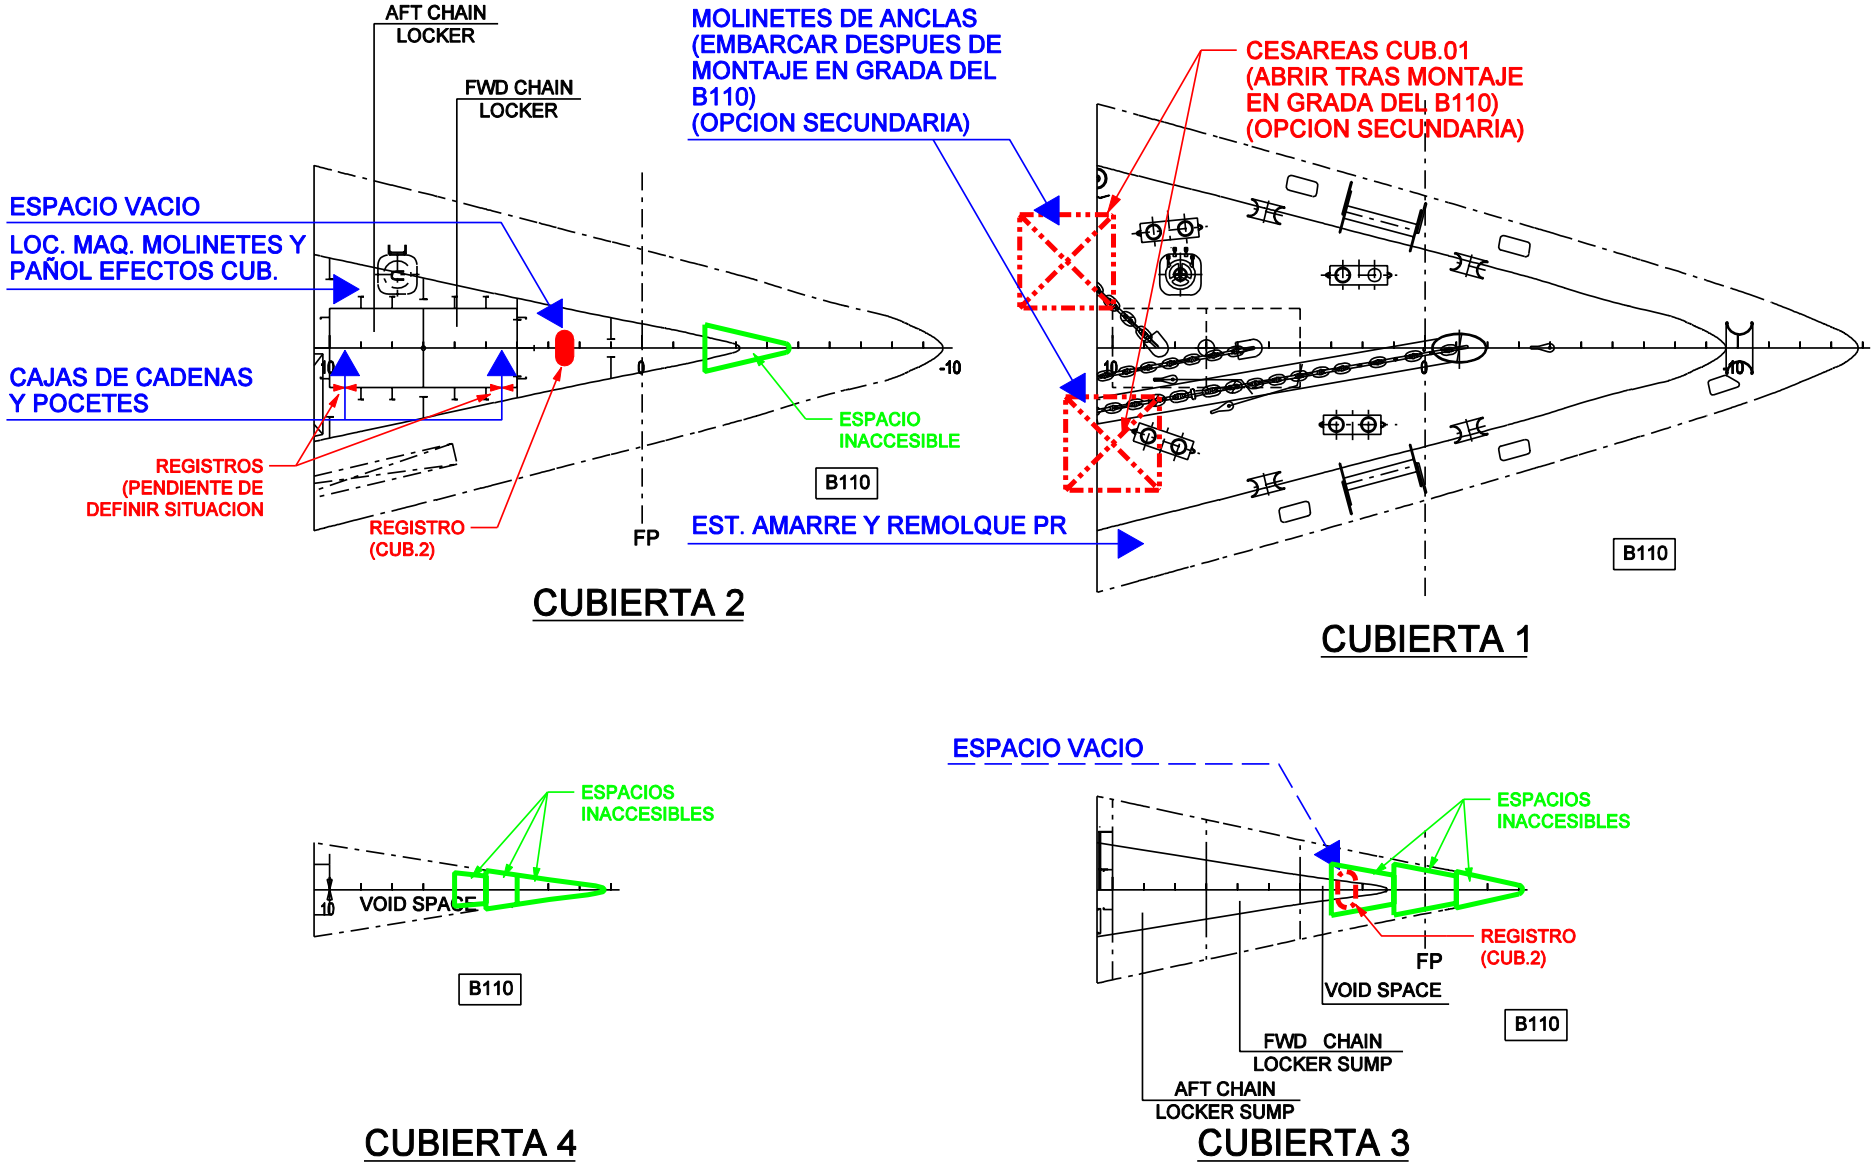
AFT CHAIN LOCKER
FWD CHAIN LOCKER
ESPACIO VACIO
LOC. MAQ. MOLINETES Y PAÑOL EFECTOS CUB.
CAJAS DE CADENAS Y POCETES
REGISTROS (PENDIENTE DE DEFINIR SITUACION
REGISTRO (CUB.2)
FP
ESPACIO INACCESIBLE
B110
MOLINETES DE ANCLAS (EMBARCAR DESPUES DE MONTAJE EN GRADA DEL B110) (OPCION SECUNDARIA)
EST. AMARRE Y REMOLQUE PR
CESAREAS CUB.01 (ABRIR TRAS MONTAJE EN GRADA DEL B110) (OPCION SECUNDARIA)
B110
CUBIERTA 2
CUBIERTA 1
ESPACIOS INACCESIBLES
VOID SPACE
B110
CUBIERTA 4
ESPACIO VACIO
ESPACIOS INACCESIBLES
REGISTRO (CUB.2)
FP
VOID SPACE
B110
FWD CHAIN LOCKER SUMP
AFT CHAIN LOCKER SUMP
CUBIERTA 3


5. TRABAJOS A REALIZAR EN CADA ETAPA DE PREARMAMENTO, DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FECHA DE NECESIDAD DEL PLANO



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 18 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.SB3.I	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
CUBIERTA 3 POSICION INVERTIDA	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T

Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	PREFABRICACION DEL SUB-BLOQUE	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
6110321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTRICAS	1103018070N	PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110081771B	MONT. DE TUBERIA	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
		3003000030S	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	1103013210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03




INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 19 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.SB2.I
CUBIERTA 2 POSICION INVERTIDA

BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T

Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	PREFABRICACION DEL SUB-BLOQUE	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
6110321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTRICAS	1103018070N	PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110167001B	MONT. BRAZOLA DE REGISTRO	1106011010N	LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
		1676002010N	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02
6110081771B	MONT. DE TUBERIA	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
		3003000030S	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	1103013210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03




INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 20 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.P1/1.N
ANTES DEL CHORREADO POSICION NORMAL

BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T


Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	UNION DE SUB-BLOQUES	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
		1611000030N	PIEZAS FUNDIDAS DEL CASCO. DISPOSICION Y DETALLES	15/6/02
6110631111B	CHORREADO Y PINTADO (ZONA BUZARDAS)	6316002010S	PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS	1/11/01
5110195001B	VOLTEO DEL CONJUNTO B110/1 A POSICION NORMAL	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
6110163003B	MONT. REFORZADO DESCARGAS AL MAR	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110081771B	MONT. DE TUBERIA	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110623001B	MONT. ESCALAS VERTICALES	1106011030N	DISPOSICION Y DETALLES DE ESCALAS BLOQUE 110	15/4/03
6110301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
		3003000030S	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110633661B	MONT. ELEMENT.DIVERS. SIST. PROTECCION CATODICA ACTIVA/PASIVA (SOPORT. ELECTRODOS REFERENCIA, ETC)	6336002010N	PROTECCION CATODICA. DISPOSICION Y DETALLES	1/6/02
6110321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	1103013210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110635441B	MONT. VARILLAS AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO	6356002070N	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO. DETALLES	15/6/02
		6356012010N	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO ZONA 01. DISPOSICION	15/3/03



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 21 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.CHP/1.N	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
CHORREADO Y PINTADO POSICION NORMAL	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T


Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
6110631111B	CHORREADO Y PINTADO	6316002010S	PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS	1/11/01



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 22 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.SB1.I	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
CUBIERTA 1 POSICION INVERTIDA	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T


Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	PREFABRICACION DEL SUB-BLOQUE	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
6110167661B	MONT. BRAZOLAS Y SOPORTES SENSORES POSICION DE ESCOTILLAS	1106011010N	LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
		1676002010N	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02
6110321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTRICAS	1103018070N	PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110185002B	MONT. REFORZADO POLINES ESTACION AMARRE PR (BITAS, GUIA PR, CONSOLA CONTROL MOLINETES, ESTOPOR ANCLA PR, ETC)	1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
6110081771B	MONT. DE TUBERIA	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
		3003000030S	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	1103013210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 23 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.SB01.I	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
CUBIERTA 01 POSICION INVERTIDA	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T


Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	PREFABRICACION DEL SUB-BLOQUE	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
6110182001B	MONT. CANCAMOS, OREJETAS Y REFORZADO PARA MANIOBRA EQUIP. SOBRE ESCOTILLAS Y TRONCOS ACCESO	1822000010N	CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS	15/3/02
6110167661B	MONT. BRAZOLAS Y SOPORTES SENSORES POSICION DE ESCOTILLAS	1106011010N	LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
		1676002010N	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02
6110612551B	MONT. REFORZADO DE TINTEROS PARA CANDELEROS ALREDEDOR DE ESCOTILLAS, CANDELEROS EN CUB. EXTERIOR Y CANDELEROS MAL TIEMPO	6126012110N	CANDELEROS Y PASAMANOS ZONA 01. DISP.Y DET.	15/3/03
6110321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTRICAS	1103018070N	PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110183001B	MONT. POLINES Y REFORZADO EQUIPO ELECTRICO DIVERSO	1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
6110081771B	MONT. DE TUBERIA	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
		3003000030S	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	1103013210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 24 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.P1/2.N	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
ANTES DEL CHORREADO POSICION NORMAL	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T


Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	UNION DE SUB-BLOQUES	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
5110195001B	VOLTEO DEL CONJUNTO B110/2 A POSICION NORMAL	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
6110163003B	MONT. REFORZADO DESCARGAS AL MAR	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110612551B	MONT. TINTEROS, SOPORT. PARA CANDELEROS ALREDEDOR DE ESCOTILLAS, CANDELEROS EN CUB. EXTERIOR Y CANDELEROS MAL TIEMPO	6126012110N	CANDELEROS Y PASAMANOS ZONA 01. DISP.Y DET.	15/3/03
6110183001B	MONT. POLINES Y REFORZADO EQUIPO ELECTRICO DIVERSO	1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
6110185002B	MONT. POLINES ESTACION AMARRE PR (BITAS, GUIA PR, CONSOLA CONTROL MOLINETES, ESTOPOR ANCLA PR, ETC)	1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
6110081771B	MONT. DE TUBERIA	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110623001B	MONT. ESCALAS VERTICALES	1106011030N	DISPOSICION Y DETALLES DE ESCALAS BLOQUE 110	15/4/03
6110301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
		3003000030S	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110504661B	MONT. SOPORTES DE APARATOS Y ELEMENT.DIVERS. DE INSTRUMENTACION (TRANSMIS/INTERRUPT. DE NIVEL, TRANSMIS/INTERRUPT. DE TEMPERATURA, TRANSMIS/INTERRUPT. DE PRESION, PANELES DE MANOMETROS, ETC)	1107015040N	INSTRUMENTACION. PLANOS DE INSTALACION BLOQUE 110	1/9/03
6110611551B	MONT. ELEMENT.DIVERS. ASTA BANDERA PR (TINTERO, SOPORTE, REFORZADO CUBIERTA, ETC)	1106012060N	ASTA BANDERA PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/9/03
6110161001B	MONT. ESCOBEN Y REGOLA ANCLA PR	1106012030N	ESCOBENES Y REGOLAS	1/2/03
6110161002B	MONT. GATERAS Y REFORZADO CUBIERTA	1106012040N	GATERAS	1/2/03
6110581001B	MONT.ACCESOR. MANIOBRA ANCLAS (SOPORT. PLANCHA ROZAMIENTO ANCLA PR, CANCAMOS BOZAS CADENA PR Y REFORZADO, ETC)	5816012010N	MANIOBRA DE ANCLAS. DISPOSICION Y DETALLES	15/4/03
6110582001B	MONT. ELEMENT.DIVERS. ESTACION DE AMARRE PR (BITAS, GUIA PROA, CANCAMO BOZA REMOLQUE Y REFORZADO CUB, ETC)	1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
		1106012010N	AMARRE Y REMOLQUE PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
		1106012050N	GUIA DE PROA	1/4/03
6110582551B	MONT. ELEMENT.DIVERS. CARRETELES PARA ESTACHAS PR (REFORZADO CASCO, ETC)	1106012020N	CARRETELES PARA ESTACHAS PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
6110671551B	MONT. ESTIBAS DIVERSAS EN LOCALES VARIOS	6716002130N	ESTIBAS DIVERSAS. DETALLES	1/6/02
		6716012010N	ESTIBAS DIVERSAS ZONA 01. SITUACION	15/4/03
6110321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	1103013210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110635441B	MONT. VARILLAS AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO	6356002070N	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO. DETALLES	15/6/02
		6356012010N	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO ZONA 01. DISPOSICION	15/3/03



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 25 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.CHP/2.N	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
CHORREADO Y PINTADO POSICION NORMAL	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T


Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
6110631111B	CHORREADO Y PINTADO	6316002010S	PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS	1/11/01



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 26 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.P2.N	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
DESPUES DE PINTADO POSICION NORMAL	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T

Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5110195001B	UNION DE CONJUNTOS B110/1+B110/2	1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
		1611000030N	PIEZAS FUNDIDAS DEL CASCO. DISPOSICION Y DETALLES	15/6/02
6110081771B	MONT. DE TUBERIA EN ZONA UNION CONJUNTOS B110/1-B110/2	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110623001B	MONT. ESCALA VERTICAL EN ZONA UNION CONJUNTOS B110/1-B110/2	1106011030N	DISPOSICION Y DETALLES DE ESCALAS BLOQUE 110	15/4/03
6110167001B	MONT. TAPA DE REGISTRO	1106011010N	LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
		1676002010N	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02
6110167661B	MONT. TAPAS DE ESCOTILLAS	1106011010N	LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
		1676002010N	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02
6110167662B	MONT. PORTAS EST.AMARRE Y REMOLQUE PR (PORTAS OBSERV, TAPAS HIDRAULICAS, ETC)	1676012020N	PUERTAS PARA AREAS DE FONDEO Y AMARRE ZONA 01. DISP. DET.	15/4/03
6110185002B	MONT. POLINES ESTACION AMARRE PR (GUIAS BR/ER, ETC)	1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
6110582001B	MONT. ELEMENT.DIVERS. ESTACION DE AMARRE PR (GUIAS BR/ER, ETC)	1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
		1106012010N	AMARRE Y REMOLQUE PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
6110071881B	TENDIDO DE CABLES SIST. 24 VDC.	3143000010N	UNIFILAR RED DE 24 VDC.	15/7/02
		3143001010S	RUTAS RED 24 VDC.	15/8/02
	TENDIDO DE CABLES SIST. 60 HZ.	3203000010S	UNIFILAR DE 60 HZ.	4/5/01
	TENDIDO DE CABLES SIST. ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F	4363000100N	UNIFILAR ALARMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/7/02
		4363001100S	RUTAS SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/8/02
	TENDIDO DE CABLES SIST. ALUMBRADO	3313010020N	UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
		3313011020S	RUTAS DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	3313000080N	UNIFILAR SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/12/02
		3313001080S	RUTAS SISTEMA ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/1/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. DE FUERZA	3203010070N	UNIFILAR DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
		3203011070S	RUTAS DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. DESMAGNETIZACION	4753000030N	UNIFILAR Y CONEXIONADO SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/7/02
		4753001030S	RUTAS SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/10/02
	TENDIDO DE CABLES SIST. DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	4314000310N	DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/9/03
		4314001310S	RUTA DE CABLES SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/10/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. GENERAL DE CONTROL ZONA DE FUEGO	2523000110N	UNIFILAR GENERAL DE CONTROL ZONA DE FUEGO 1	1/8/03



INGENIERIA DE PRODUCCION	ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA	Nº DOCUMENTO: 110.9.13.001.0F	Pagina 27 de 50
		REVISION: A	Fecha: 25.04.03

ETAPA DE PREARMAMENTO: 110.P2.N	BLOQUE: 110	Cpp: 10,5	Eslora: 16,2	Puntal: 13
DESPUES DE PINTADO POSICION NORMAL	Zona 1	Cpr: -16	Manga 12,3	Peso 63 T

Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
6110071881B	TENDIDO DE CABLES SIST. GENERAL DE CONTROL ZONA DE FUEGO	2523001110S	RUTAS DIAGRAMA GENERAL DE CONTROL. ZONA DE FUEGO 1	1/8/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	4223000030N	UNIFILAR SISTEMA DE LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	1/12/02
		4223001030S	RUTAS SISTEMA LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	2/4/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. ORDENES GENERALES	4314010240N	DIAGRAMA DE CABLEADO SISTEMA ORDENES GENERALES ZONA 01	1/7/03
		4314011240S	RUTA DE CABLES SISTEMA ORDENES GENERALES ZONA 01	1/8/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. TELEFONOS AUTOEXCITADOS	4314010180N	DIAGRAMA CABLEADO SIST. TELEFONOS AUTOEXCITADOS ZONA 01	1/7/03
		4314011180S	RUTA DE CABLES SISTEMA TELEFONOS AUTOEXCITADOS ZONA 01	1/8/03
	TENDIDO DE CABLES SIST. TELEFONOS AUTOMATICOS	4314010120N	DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA TELEFONOS AUTOMATICOS ZONA 01	1/7/03
		4314011120S	RUTA DE CABLES SISTEMA TELEFONOS AUTOMATICOS ZONA 01	1/8/03
6110071882B	MONT. EQUIPO ELECTRICO DIVERSO	1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
		1103013010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. ALARMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	4363000100N	UNIFILAR ALARMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/7/02
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. ALUMBRADO	3313010020N	UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	3313000080N	UNIFILAR SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/12/02
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. DESMAGNETIZACION	4753000030N	UNIFILAR Y CONEXIONADO SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/7/02
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	4314000310N	DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/9/03
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. FUERZA	3203010070N	UNIFILAR DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	4223000030N	UNIFILAR SISTEMA DE LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	1/12/02
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. PORTATILES UHF Y PAGING	4334000090N	DIAGRAMA DE CABLEADO PORTATILES UHF Y PAGING	1/5/03
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. RED DE DATOS PUBLICOS Y ADMINIST.	4314000330N	DIAGR. CABLEADO REDES DE DATOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVA	1/9/03
	MONT. EQUIPO ELECTRICO SIST. TELEFONO SUBMARINO	4334000130N	DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DE TELEFONO SUBMARINO	1/5/03
6110582551B	MONT. CARRETELES PARA ESTACHAS PR	1106012020N	CARRETELES PARA ESTACHAS PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
6110081771B	MONT. DE TUBERIA DE CONEXION A EQUIPOS	1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
6110320883B	CONEX. SIST. FUERZA	3203012070S	CONEXIONADO DE FUERZA ZONA 01	1/9/03
6110331883B	CONEX. SIST. ALUMBRADO	3313010020N	UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
6110436883B	CONEX. SIST. ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F	4363002100S	CONEXIONADO ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F	15/10/02
6110631112B	REPASOS DE PINTADO	6316002010S	PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS	1/11/01

6. PLANOS NECESARIOS EN PREARMAMENTO DEL BLOQUE 110

SECCION: ***ESTRUCTURAS***

Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
1101010020N		POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
1101010040N		POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
1101011000S		ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
1611000030N	A	PIEZAS FUNDIDAS DEL CASCO. DISPOSICION Y DETALLES	15/6/02

PLANOS NECESARIOS: 4

SECCION:	***INGENIERIA MECANICA***		
Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
1822000010N		CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS	15/3/02

PLANOS NECESARIOS: 1

SECCION: ***ELECTRICIDAD***

Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
1103013010N		SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
1103013210N		CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
1103018070N		PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
2523000110N		UNIFILAR GENERAL DE CONTROL ZONA DE FUEGO 1	1/8/03
2523001110S		RUTAS DIAGRAMA GENERAL DE CONTROL. ZONA DE FUEGO 1	1/8/03
3003000030S	A	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
3143000010N	A	UNIFILAR RED DE 24 VDC.	15/7/02
3143001010S	A	RUTAS RED 24 VDC.	15/8/02
3203000010S	D	UNIFILAR DE 60 HZ.	4/5/01
3203010070N		UNIFILAR DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
3203011070S		RUTAS DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
3203012070S		CONEXIONADO DE FUERZA ZONA 01	1/9/03
3313000080N		UNIFILAR SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/12/02
3313001080S		RUTAS SISTEMA ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/1/03
3313010020N		UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
3313011020S		RUTAS DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
4223000030N		UNIFILAR SISTEMA DE LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	1/12/02
4223001030S		RUTAS SISTEMA LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	2/4/03
4363000100N	A	UNIFILAR ALARMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/7/02
4363001100S	A	RUTAS SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/8/02
4363002100S		CONEXIONADO ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F	15/10/02
4753000030N	A	UNIFILAR Y CONEXIONADO SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/7/02
4753001030S		RUTAS SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/10/02

PLANOS NECESARIOS: 23

SECCION: ***ELECTRONICA***

Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
4314000310N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/9/03
4314000330N		DIAGR. CABLEADO REDES DE DATOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVA	1/9/03
4314001310S		RUTA DE CABLES SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/10/03
4314010120N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA TELEFONOS AUTOMATICOS ZONA 01	1/7/03
4314010180N		DIAGRAMA CABLEADO SIST. TELEFONOS AUTOEXCITADOS ZONA 01	1/7/03
4314010240N		DIAGRAMA DE CABLEADO SISTEMA ORDENES GENERALES ZONA 01	1/7/03
4314011120S		RUTA DE CABLES SISTEMA TELEFONOS AUTOMATICOS ZONA 01	1/8/03
4314011180S		RUTA DE CABLES SISTEMA TELEFONOS AUTOEXCITADOS ZONA 01	1/8/03
4314011240S		RUTA DE CABLES SISTEMA ORDENES GENERALES ZONA 01	1/8/03
4334000090N		DIAGRAMA DE CABLEADO PORTATILES UHF Y PAGING	1/5/03
4334000130N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DE TELEFONO SUBMARINO	1/5/03

PLANOS NECESARIOS: 11

SECCION:	***SISTEMAS DE TUBERIAS***	
Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
1105010010N		DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03

PLANOS NECESARIOS: 1

SECCION: ***EQUIPO Y HABILITACION***

Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
1106011010N		LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
1106011030N		DISPOSICION Y DETALLES DE ESCALAS BLOQUE 110	15/4/03
1106012010N		AMARRE Y REMOLQUE PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
1106012020N		CARRETELES PARA ESTACHAS PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
1106012030N		ESCOBENES Y REGOLAS	1/2/03
1106012040N		GATERAS	1/2/03
1106012050N		GUIA DE PROA	1/4/03
1106012060N		ASTA BANDERA PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/9/03
1676002010N	C	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02
1676012020N		PUERTAS PARA AREAS DE FONDEO Y AMARRE ZONA 01. DISP. DET.	15/4/03
5816012010N		MANIOBRA DE ANCLAS. DISPOSICION Y DETALLES	15/4/03
6126012110N		CANDELEROS Y PASAMANOS ZONA 01. DISP.Y DET.	15/3/03
6316002010S	B	PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS	1/11/01
6336002010N	A	PROTECCION CATODICA. DISPOSICION Y DETALLES	1/6/02
6356002070N	A	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO. DETALLES	15/6/02
6356012010N		AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO ZONA 01. DISPOSICION	15/3/03
6716002130N		ESTIBAS DIVERSAS. DETALLES	1/6/02
6716012010N		ESTIBAS DIVERSAS ZONA 01. SITUACION	15/4/03

PLANOS NECESARIOS: 18

SECCION:	***CONTROL DE PLATAFORMA***		
Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
1107015040N		INSTRUMENTACION. PLANOS DE INSTALACION BLOQUE 110	1/9/03

PLANOS NECESARIOS: 1

7. LISTA DE ORDENES DE TRABAJO DEL BLOQUE 110

Area Producción: ACEROS

Centro Ejec: 134 TALLER DE ELABORACION

FASE 4 ELABORACION — OOdeT FASE: 12

OdeT	DESCRIPCION
4110161002B	ELAB. GATERAS B110
4110163003B	ELAB. DESCARGAS AL MAR B110
4110183001B	ELAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO B110
4110185002B	ELAB. POLINES ESTACION AMARRE PR B110
4110195001B	ELABORACION DE B110
4110195002B	VERIFICACION EN ELAB. DE B110
4110321001B	ELAB. PENETRACIONES ELECTR. B110
4110581001B	ELAB.ACCESOR. MANIOBRA ANCLAS B110
4110582001B	ELAB. ELEMENT.DIVERS. AMARRE Y REMOLQUE PR B110
4110836001B	ELAB. MAQUETA MANIOBRA ANCLAS, ESCOBENES Y REGOLAS B110
4110993001B	MOVIM.MATER. EN ELABORACION B110
4110993002B	MOVIM.MATER. DE POLINES EN ELAB. B110

Centro Ejec: 136 TALLER DE PREFABRICACION

FASE 5 PREFABRICACION — OOdeT FASE: 10

OdeT	DESCRIPCION
5110161001B	PREFAB. ESCOBENES Y REGOLAS B110
5110161002B	PREFAB. GATERAS B110
5110183001B	PREFAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO B110
5110185002B	PREFAB. POLINES ESTACION AMARRE PR B110
5110195001B	PREFABRICACION DE B110
5110195002B	VERIFICACION EN PREFAB. DE B110
5110582001B	PREFAB. ELEMENT.DIVERS. AMARRE Y REMOLQUE PR B110
5110992001B	SERVIC. Y PRESTAC. TEMPORALES EN PREFAB. B110
5110993001B	MOVIM.MATER. INTER. Y EXTER. EN PREFAB. B110
5110993002B	MOVIM.MATER. DE POLINES EN PREFAB. B110

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 11

OdeT	DESCRIPCION
6110161001B	MONT. ESCOBENES Y REGOLAS B110
6110161002B	MONT. GATERAS B110
6110163003B	MONT. DESCARGAS AL MAR B110
6110167001B	MONT. REGISTROS Y AMAS B110
6110182001B	MONT. CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS B110
6110183001B	MONT. POLINES EQUIPO ELECTRICO B110
6110185002B	MONT. POLINES ESTACION AMARRE PR B110
6110321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTR. B110
6110581001B	MONT.ACCESOR. MANIOBRA ANCLAS B110
6110582001B	MONT. ELEMENT.DIVERS. AMARRE Y REMOLQUE PR B110
6110623001B	MONT. ESCALAS B110

Centro Ejec: 142 TALL. SIERRAS Y CARPINT. GRADA

FASE 5 PREFABRICACION — OOdeT FASE: 1

OdeT	DESCRIPCION
5110991001B	MONT. Y DESMONT. ANDAMIOS EN PREFAB. B110

Area Producción: ***ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ARMAS***

Centro Ejec: ***185*** ***ELECTRICIDAD BUQUES***

FASE 6 MONTAJE *OOdeT FASE: 7*

OdeT	***DESCRIPCION***
6110071881B	TENDIDO DE CABLES B110
6110071882B	MONTAJE DE EQUIPO ELECTR. B110
6110301881B	MONT.SOPORT. EQUIPO ELECTR. B110 (P1)
6110320883B	CONEX. FUERZA B110
6110321881B	MONTAJE DE CANALIZACIONES ELECTRICAS B110
6110331883B	CONEX. ALUMBRADO B110
6110436883B	CONEX. ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F B110

Area Producción: HABILITACION

Centro Ejec: 168 TALLER DE CHAPA FINA

FASE 4 ELABORACION — OOdeT FASE: 3

OdeT	DESCRIPCION
4110582551B	ELAB.ACCESOR. CARRETELES PARA ESTACHAS PR B110
4110611551B	ELAB. ASTA BANDERA PR B110
4110671551B	ELAB. ESTIBAS DIVERSAS B110

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 4

OdeT	DESCRIPCION
6110582551B	MONT. CARRETELES PARA ESTACHAS PR B110
6110611551B	MONT.TINTERO Y SOPORT. ASTA BANDERA PR B110
6110612551B	MONT. TINTEROS, REFORZADO Y ESTIBA PARA CANDELEROS B110
6110671551B	MONT. ESTIBAS DIVERSAS B110

Centro Ejec: 169 TALLER DE EBANISTAS

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 1

OdeT	DESCRIPCION
6110635441B	MONT. VARILLAS DE AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO B110

Area Producción: ***MONTURAS***

Centro Ejec: ***174*** ***TALLER DE EQUIPO***

FASE 4 ELABORACION *OOdeT FASE:* *3*

OdeT	*DESCRIPCION*
4110167661B	ELAB.ACCESOR. PUERTAS ESTRUCT. Y ESCOTILLAS B110
4110611651B	ELAB. TINTERO ASTA BANDERA PR B110
4110671651B	ELAB. ESTIBAS DIVERSAS B110

Centro Ejec: ***175*** ***MONTURAS***

FASE 6 MONTAJE *OOdeT FASE:* *4*

OdeT	*DESCRIPCION*
6110167661B	MONT. PUERTAS ESTRUCT, ESCOTILLAS Y ACCESOR B110
6110167662B	MONT. PORTAS COSTADO EST.AMARRE Y REMOLQ.PR B110
6110504661B	MONT. SOPORT.APARATOS DE INSTRUMENTACION B110
6110633661B	MONT. ELEMENT.DIVERS. PROTECCION CATODICA ACTIVA/PASIVA B110

Area Producción:	***PINTORES***

Centro Ejec:	***171***	***PINTORES Y ALBAÑILES***

FASE 6 MONTAJE *OOdeT FASE: 2*

OdeT	***DESCRIPCION***
6110631111B	CHORREADO Y PINTADO B110
6110631112B	REPASOS DE PINTADO B110

Area Producción: ***PLOMEROS***

Centro Ejec: ***164*** ***TALLER DE TUBEROS***

FASE 4 ELABORACION *OOdeT FASE:* *1*

OdeT	***DESCRIPCION***
4110081771B	ELABORACION DE TUBERIA B110

FASE 6 MONTAJE *OOdeT FASE:* *1*

OdeT	***DESCRIPCION***
6110081771B	MONTAJE DE TUBERIA B110

8. LISTA DE ORDENES DE TRABAJO Y PLANOS DEL BLOQUE 110

Area Producción: ACEROS

Centro Ejec: 134 TALLER DE ELABORACION

FASE 4 ELABORACION

OdeT	DESCRIPCION	
4110161002B	**ELAB. GATERAS B110**	
· 1106012040N	GATERAS	1/2/03
4110163003B	**ELAB. DESCARGAS AL MAR B110**	
· 1105010010N	DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03
4110183001B	**ELAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO B110**	
· 1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
4110185002B	**ELAB. POLINES ESTACION AMARRE PR B110**	
· 1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
4110195001B	**ELABORACION DE B110**	
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
4110195002B	**VERIFICACION EN ELAB. DE B110**	
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
4110321001B	**ELAB. PENETRACIONES ELECTR. B110**	
· 1103018070N	PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
4110581001B	**ELAB.ACCESOR. MANIOBRA ANCLAS B110**	
· 5816012010N	MANIOBRA DE ANCLAS. DISPOSICION Y DETALLES	15/4/03
4110582001B	**ELAB. ELEMENT.DIVERS. AMARRE Y REMOLQUE PR B110**	
· 1106012010N	AMARRE Y REMOLQUE PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
4110836001B	**ELAB. MAQUETA MANIOBRA ANCLAS, ESCOBENES Y REGOLAS B110**	
4110993001B	**MOVIM.MATER. EN ELABORACION B110**	
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02
4110993002B	**MOVIM.MATER. DE POLINES EN ELAB. B110**	
· 1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
· 1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03

Centro Ejec: 136 TALLER DE PREFABRICACION

FASE 5 PREFABRICACION

OdeT	DESCRIPCION		
5110161001B	**PREFAB. ESCOBENES Y REGOLAS B110**		
· 1106012030N	ESCOBENES Y REGOLAS		1/2/03
5110161002B	**PREFAB. GATERAS B110**		
· 1106012040N	GATERAS		1/2/03
5110183001B	**PREFAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO B110**		
· 1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110		1/3/03
5110185002B	**PREFAB. POLINES ESTACION AMARRE PR B110**		
· 1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA		1/3/03
5110195001B	**PREFABRICACION DE B110**		
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110		6/12/02
· 1611000030N	A PIEZAS FUNDIDAS DEL CASCO. DISPOSICION Y DETALLES		15/6/02
5110195002B	**VERIFICACION EN PREFAB. DE B110**		
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110		6/12/02
5110582001B	**PREFAB. ELEMENT.DIVERS. AMARRE Y REMOLQUE PR B110**		
· 1106012010N	AMARRE Y REMOLQUE PROA. DISPOSICION Y DETALLES		1/4/03
5110992001B	**SERVIC. Y PRESTAC. TEMPORALES EN PREFAB. B110**		
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110		6/12/02
5110993001B	**MOVIM.MATER. INTER. Y EXTER. EN PREFAB. B110**		
· 1101011000S	ESTRUCTURA BLOQUE 110		6/12/02
5110993002B	**MOVIM.MATER. DE POLINES EN PREFAB. B110**		
· 1101010020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110		1/3/03
· 1101010040N	POLINES ESTACION AMARRE PROA		1/3/03

FASE 6 MONTAJE

OdeT	DESCRIPCION	
6110161001B	**MONT. ESCOBENES Y REGOLAS B110**	
· 1106012030N	ESCOBENES Y REGOLAS	1/2/03

Area Producción: ***ACEROS***

6110161002B MONT. GATERAS B110

· 1106012040N		GATERAS	1/2/03

6110163003B MONT. DESCARGAS AL MAR B110

· 1105010010N		DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110	15/1/03

6110167001B MONT. REGISTROS Y AMAS B110

· 1106011010N		LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110	1/2/03
· 1676002010N	C	CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES	15/1/02

6110182001B MONT. CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS B110

· 1822000010N		CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS	15/3/02

6110183001B MONT. POLINES EQUIPO ELECTRICO B110

· 1101010020N		POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03

6110185002B MONT. POLINES ESTACION AMARRE PR B110

· 1101010040N		POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03

6110321001B MONT. PENETRACIONES ELECTR. B110

· 1103018070N		PENETRACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03

6110581001B MONT.ACCESOR. MANIOBRA ANCLAS B110

· 5816012010N		MANIOBRA DE ANCLAS. DISPOSICION Y DETALLES	15/4/03

6110582001B MONT. ELEMENT.DIVERS. AMARRE Y REMOLQUE PR B110

· 1101010040N		POLINES ESTACION AMARRE PROA	1/3/03
· 1106012010N		AMARRE Y REMOLQUE PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
· 1106012050N		GUIA DE PROA	1/4/03

6110623001B MONT. ESCALAS B110

· 1106011030N		DISPOSICION Y DETALLES DE ESCALAS BLOQUE 110	15/4/03

Centro Ejec: ***142*** ***TALL. SIERRAS Y CARPINT. GRADA***

FASE 5 PREFABRICACION

OdeT	***DESCRIPCION***	

5110991001B MONT. Y DESMONT. ANDAMIOS EN PREFAB. B110

· 1101011000S		ESTRUCTURA BLOQUE 110	6/12/02

Area Producción: ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ARMAS

Centro Ejec: 185 ELECTRICIDAD BUQUES

FASE 6 MONTAJE

OdeT		DESCRIPCION	
6110071881B		**TENDIDO DE CABLES B110**	
· 2523000110N		UNIFILAR GENERAL DE CONTROL ZONA DE FUEGO 1	1/8/03
· 2523001110S		RUTAS DIAGRAMA GENERAL DE CONTROL. ZONA DE FUEGO 1	1/8/03
· 3143000010N	A	UNIFILAR RED DE 24 VDC.	15/7/02
· 3143001010S	A	RUTAS RED 24 VDC.	15/8/02
· 3203000010S	D	UNIFILAR DE 60 HZ.	4/5/01
· 3203010070N		UNIFILAR DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
· 3203011070S		RUTAS DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
· 3313000080N		UNIFILAR SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/12/02
· 3313001080S		RUTAS SISTEMA ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/1/03
· 3313010020N		UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
· 3313011020S		RUTAS DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
· 4223000030N		UNIFILAR SISTEMA DE LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	1/12/02
· 4223001030S		RUTAS SISTEMA LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	2/4/03
· 4314000310N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/9/03
· 4314001310S		RUTA DE CABLES SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/10/03
· 4314010120N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA TELEFONOS AUTOMATICOS ZONA 01	1/7/03
· 4314010180N		DIAGRAMA CABLEADO SIST. TELEFONOS AUTOEXCITADOS ZONA 01	1/7/03
· 4314010240N		DIAGRAMA DE CABLEADO SISTEMA ORDENES GENERALES ZONA 01	1/7/03
· 4314011120S		RUTA DE CABLES SISTEMA TELEFONOS AUTOMATICOS ZONA 01	1/8/03
· 4314011180S		RUTA DE CABLES SISTEMA TELEFONOS AUTOEXCITADOS ZONA 01	1/8/03
· 4314011240S		RUTA DE CABLES SISTEMA ORDENES GENERALES ZONA 01	1/8/03
· 4363000100N	A	UNIFILAR ALARMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/7/02
· 4363001100S	A	RUTAS SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/8/02
· 4753000030N	A	UNIFILAR Y CONEXIONADO SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/7/02
· 4753001030S		RUTAS SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/10/02
6110071882B		**MONTAJE DE EQUIPO ELECTR. B110**	
· 1101010020N		POLINES EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	1/3/03
· 1103013010N		SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
· 3203010070N		UNIFILAR DE FUERZA ZONA 01	1/8/03
· 3313000080N		UNIFILAR SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR Y DE GALA	1/12/02
· 3313010020N		UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
· 4223000030N		UNIFILAR SISTEMA DE LUCES NAVEGACION, SEÑALES Y ATERRIZAJE	1/12/02
· 4314000310N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DISTRIBUCION VIDEO (CCTV)	1/9/03
· 4314000330N		DIAGR. CABLEADO REDES DE DATOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVA	1/9/03
· 4334000090N		DIAGRAMA DE CABLEADO PORTATILES UHF Y PAGING	1/5/03
· 4334000130N		DIAGRAMA CABLEADO SISTEMA DE TELEFONO SUBMARINO	1/5/03
· 4363000100N	A	UNIFILAR ALARMA DETECCION DE INCENDIOS CIR.F	15/7/02
· 4753000030N	A	UNIFILAR Y CONEXIONADO SISTEMA DE DESMAGNETIZACION	15/7/02
6110301881B		**MONT.SOPORT. EQUIPO ELECTR. B110 (P1)**	
· 1103013010N		SITUACION EQUIPO ELECTRICO BLOQUE 110	15/3/03
· 3003000030S	A	PLANTILLAS PARA SOLDAR SOPORTES TIPO PERNO	2/12/02
6110320883B		**CONEX. FUERZA B110**	
· 3203012070S		CONEXIONADO DE FUERZA ZONA 01	1/9/03
6110321881B		**MONTAJE DE CANALIZACIONES ELECTRICAS B110**	
· 1103013210N		CANALIZACIONES ELECTRICAS BLOQUE 110	15/3/03
6110331883B		**CONEX. ALUMBRADO B110**	
· 3313010020N		UNIFILAR DE ALUMBRADO ZONA 01	1/8/03
6110436883B		**CONEX. ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F B110**	
· 4363002100S		CONEXIONADO ALARMA DETECCION INCENDIOS CIR.F	15/10/02

Area Producción: HABILITACION

Centro Ejec: 168 TALLER DE CHAPA FINA

FASE 4 ELABORACION

OdeT		DESCRIPCION	
4110582551B		**ELAB.ACCESOR. CARRETELES PARA ESTACHAS PR B110**	
· 1106012020N		CARRETELES PARA ESTACHAS PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
4110611551B		**ELAB. ASTA BANDERA PR B110**	
· 1106012060N		ASTA BANDERA PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/9/03
4110671551B		**ELAB. ESTIBAS DIVERSAS B110**	
· 6716002130N		ESTIBAS DIVERSAS. DETALLES	1/6/02
· 6716012010N		ESTIBAS DIVERSAS ZONA 01. SITUACION	15/4/03

FASE 6 MONTAJE

OdeT		DESCRIPCION	
6110582551B		**MONT. CARRETELES PARA ESTACHAS PR B110**	
· 1106012020N		CARRETELES PARA ESTACHAS PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/4/03
6110611551B		**MONT.TINTERO Y SOPORT. ASTA BANDERA PR B110**	
· 1106012060N		ASTA BANDERA PROA. DISPOSICION Y DETALLES	1/9/03
6110612551B		**MONT. TINTEROS, REFORZADO Y ESTIBA PARA CANDELEROS B110**	
· 6126012110N		CANDELEROS Y PASAMANOS ZONA 01. DISP.Y DET.	15/3/03
6110671551B		**MONT. ESTIBAS DIVERSAS B110**	
· 6716002130N		ESTIBAS DIVERSAS. DETALLES	1/6/02
· 6716012010N		ESTIBAS DIVERSAS ZONA 01. SITUACION	15/4/03

Centro Ejec: 169 TALLER DE EBANISTAS

FASE 6 MONTAJE

OdeT		DESCRIPCION	
6110635441B		**MONT. VARILLAS DE AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO B110**	
· 6356002070N	A	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO. DETALLES	15/6/02
· 6356012010N		AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO ZONA 01. DISPOSICION	15/3/03

Area Producción: ***MONTURAS***

Centro Ejec: ***174*** ***TALLER DE EQUIPO***

FASE 4 ELABORACION

OdeT		*DESCRIPCION*	
4110167661B		**ELAB.ACCESOR. PUERTAS ESTRUCT. Y ESCOTILLAS B110**	
· 1106011010N		*LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110*	*1/2/03*
· 1676002010N	*C*	*CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES*	*15/1/02*
4110611651B		**ELAB. TINTERO ASTA BANDERA PR B110**	
· 1106012060N		*ASTA BANDERA PROA. DISPOSICION Y DETALLES*	*1/9/03*
4110671651B		**ELAB. ESTIBAS DIVERSAS B110**	
· 6716002130N		*ESTIBAS DIVERSAS. DETALLES*	*1/6/02*
· 6716012010N		*ESTIBAS DIVERSAS ZONA 01. SITUACION*	*15/4/03*

Centro Ejec: ***175*** ***MONTURAS***

FASE 6 MONTAJE

OdeT		*DESCRIPCION*	
6110167661B		**MONT. PUERTAS ESTRUCT, ESCOTILLAS Y ACCESOR B110**	
· 1106011010N		*LISTA DE CIERRES ESTRUCTURALES BLOQUE 110*	*1/2/03*
· 1676002010N	*C*	*CIERRES ESTRUCTURALES. DETALLES*	*15/1/02*
6110167662B		**MONT. PORTAS COSTADO EST.AMARRE Y REMOLQ.PR B110**	
· 1676012020N		*PUERTAS PARA AREAS DE FONDEO Y AMARRE ZONA 01. DISP. DET.*	*15/4/03*
6110504661B		**MONT. SOPORT.APARATOS DE INSTRUMENTACION B110**	
· 1107015040N		*INSTRUMENTACION. PLANOS DE INSTALACION BLOQUE 110*	*1/9/03*
6110633661B		**MONT. ELEMENT.DIVERS. PROTECCION CATODICA ACTIVA/PASIVA B110**	
· 6336002010N	*A*	*PROTECCION CATODICA. DISPOSICION Y DETALLES*	*1/6/02*

Area Producción: ***PINTORES***

Centro Ejec: ***171*** ***PINTORES Y ALBAÑILES***

FASE 6 MONTAJE

OdeT	*DESCRIPCION*	
6110631111B	**CHORREADO Y PINTADO B110**	
· *6316002010S*	*B PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS*	*1/11/01*
6110631112B	**REPASOS DE PINTADO B110**	
· *6316002010S*	*B PINTADO. ESPECIFICACION Y ESQUEMAS*	*1/11/01*

Area Producción: ***PLOMEROS***

Centro Ejec: ***164*** ***TALLER DE TUBEROS***

FASE 4 ELABORACION

OdeT	*DESCRIPCION*	
4110081771B	**ELABORACION DE TUBERIA B110**	
· 1105010010N	*DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110*	*15/1/03*

FASE 6 MONTAJE

OdeT	*DESCRIPCION*	
6110081771B	**MONTAJE DE TUBERIA B110**	
· 1105010010N	*DISPOSICION TUBERIA BLOQUE 110*	*15/1/03*
